Reporte Operativo

Mina San Bernardo

ESCENARIO DEMO · ARRANQUE 400 t/d	Simulación conceptual; no representa inventario, producción ni mediciones confirmadas.

Generado	02/08/2026 01:37:14	**Periodo**	Turno 1 · 00:00-07:00 · 02/08/2026
Turno	Turno 1 · 00:00-07:00	**Última lectura**	02/08/2026 01:37:14
Fuente	DATOS DEMO	**Escenario**	Arranque · 400 t/d
Catálogo	Catálogo conceptual no confirmado	**Capacidad demo**	400 t/d


Indicadores principales

Producción actual	**19.0 t/h**	**Acumulado del día**	**27.4 t**
Avance objetivo 400 t/d	**6.8 %**	**Demanda eléctrica**	**469.5 kW**
Energía acumulada	**665.8 kWh**	**Consumo específico**	**24.30 kWh/t**
Agua recirculada	**84.0 %**	**Alarmas activas**	**3**

KPIs estratégicos del escenario

Indicador	Valor	Meta	RAG	Fuente demo	Actualización
Producción diaria	392 t/día	400 t/día	Precaución	SCADA, básculas	02/08/2026 06:00
Disponibilidad planta	87.2 %	85 %	En objetivo	SCADA, CMMS	02/08/2026 06:00
Recuperación oro	87.5 %	88 %	Precaución	Laboratorio, balance metalúrgico	27/07/2026 07:00
Consumo agua fresca	1.05 m3/t	1 m3/t	Precaución	Medidores de flujo	02/08/2026 06:00
Consumo energético total	25.2 kWh/t	25 kWh/t	Precaución	Medidores eléctricos	02/08/2026 06:00
Días sin accidente incapacitante	75 días	60 días	En objetivo	HSE	02/08/2026 06:00
Disponibilidad SCADA/Red	96.2 %	95 %	En objetivo	Monitoreo OT	27/07/2026 07:00

Tendencias operativas

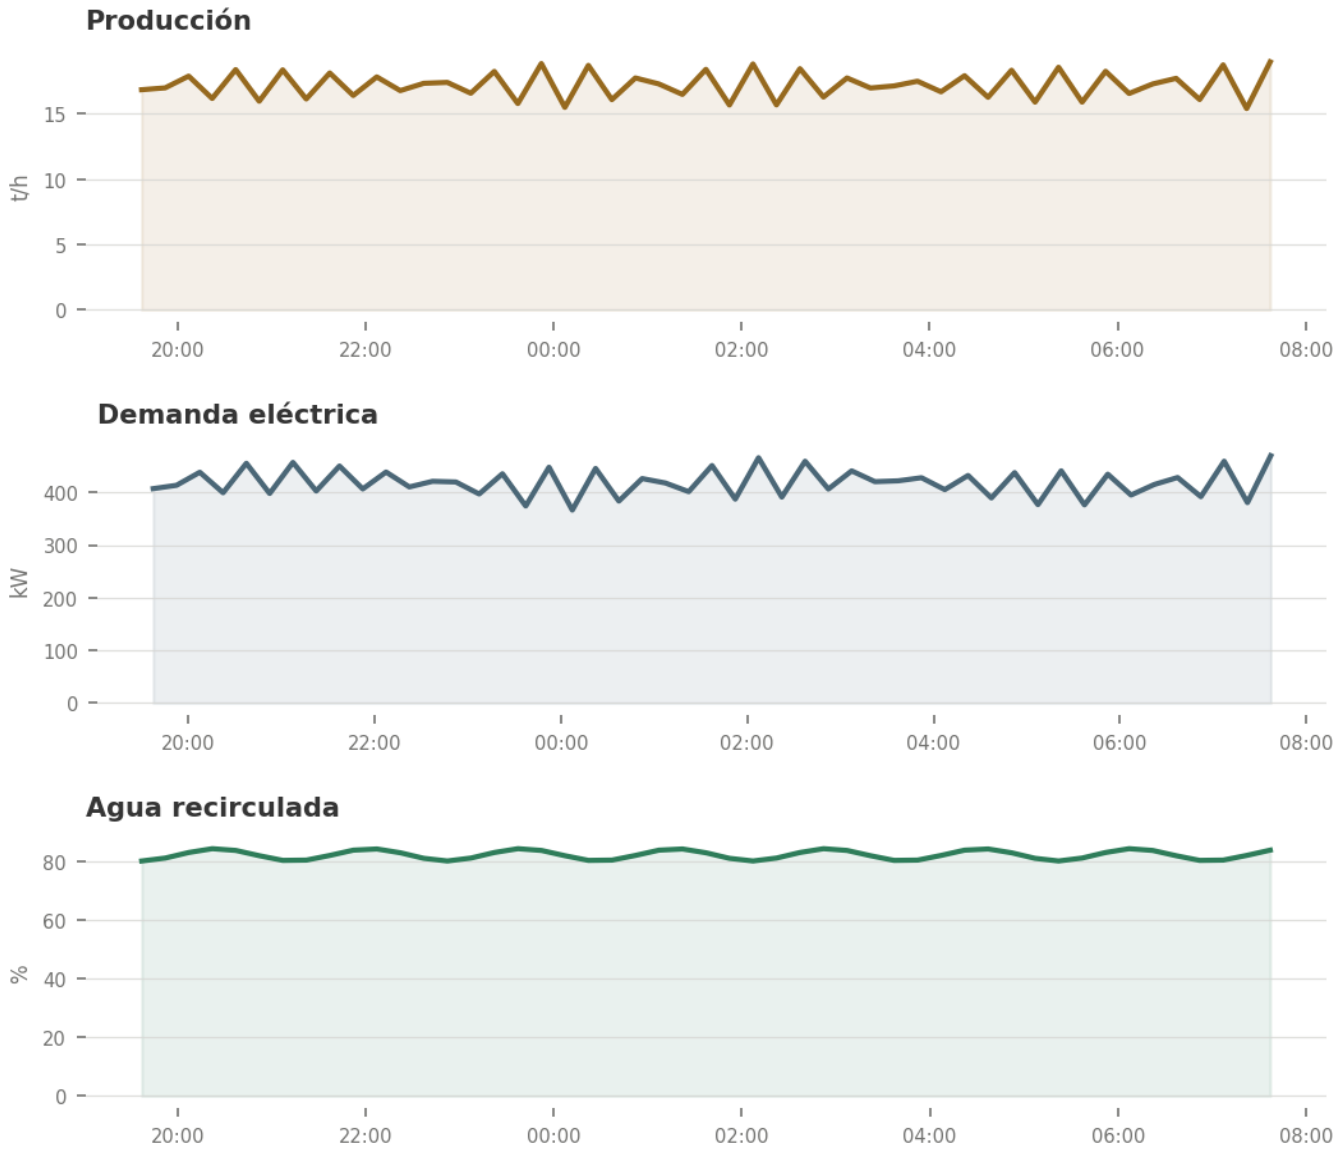

Resumen de equipos conceptuales

Los equipos listados son representativos del P&ID; conceptual y no constituyen un inventario validado.

Área	Equipo	Tipo	Estado	Lecturas demo	Última actualización
Recepción y manejo de mineral	Tolva HT-101	Tolva	Operando	Nivel de tolva: 55.51 %	02/08/2026 01:37:14
Recepción y manejo de mineral	Alimentador VF-102	Alimentador vibratorio	Operando	Alimentación: 18.98 t/h	02/08/2026 01:37:14
Recepción y manejo de mineral	Banda CV-103	Transportador	Operando	Carga transportada: 18.83 t/h	02/08/2026 01:37:14
Recepción y manejo de mineral	Trituradora CR-104	Trituradora	Alarma	Temperatura de rodamiento: 88.38 °C Mineral triturado: 18.73 t/h	02/08/2026 01:37:14
Molienda y clasificación	Molino ML-201	Molino	Advertencia	Temperatura de chumacera: 77.2 °C Densidad de pulpa: 1392.9 kg/m³	02/08/2026 01:37:14
Molienda y clasificación	Ciclones CY-202	Batería de ciclones	Operando	Presión de alimentación: 113.18 kPa Densidad de alimentación: 1339.3 kg/m³	02/08/2026 01:37:14

Área	Equipo	Tipo	Estado	Lecturas demo	Última actualización
Molienda y clasificación	Cajón SP-203	Cajón de bombeo	Operando	Nivel de cajón: 49.04 %	02/08/2026 01:37:14
Molienda y clasificación	Bomba P-201A	Bomba de pulpa	Operando	Presión de descarga: 147.38 kPa Flujo de pulpa: 117.42 m³/h	02/08/2026 01:37:14
Molienda y clasificación	Bomba P-201B	Bomba de pulpa	Detenido	Presión de descarga: 0 kPa Flujo de pulpa: 0 m³/h	02/08/2026 01:37:14
Beneficio metalúrgico Au-Ag	Celdas TK-301	Celdas metalúrgicas	Operando	pH de proceso: 9.18 pH Potencial ORP/Eh: 283.83 mV Nivel de celda: 72 %	02/08/2026 01:37:14
Espesamiento y filtración	Espesador TH-401	Espesador	Operando	Nivel de cama: 56.69 % Densidad de descarga: 1474.52 kg/m³	02/08/2026 01:37:14
Espesamiento y filtración	Filtro prensa FP-402	Filtro prensa	Operando	Presión hidráulica: 13.04 bar	02/08/2026 01:37:14
Manejo de agua y jales	Tanque WT-601	Tanque de agua	Operando	Nivel de tanque: 75.45 % Conductividad: 1210.52 µS/cm	02/08/2026 01:37:14
Manejo de agua y jales	Clarificador CL-602	Clarificador	Operando	Nivel de clarificador: 60.6 %	02/08/2026 01:37:14
Manejo de agua y jales	Bomba P-602A	Bomba de agua	Operando	Presión de descarga: 7.05 bar Flujo de retorno: 91.04 m³/h	02/08/2026 01:37:14
Manejo de agua y jales	Bomba P-602B	Bomba de agua	Sin comunicación	Presión de descarga: N/D Flujo de retorno: N/D	02/08/2026 01:37:14

Alarmas relevantes

Severidad	Equipo	Alarma	Detalle	Activa desde
Crítica	Trituradora CR-104	Temperatura alta	Temperatura demo de rodamiento por encima del rango conceptual.	02/08/2026 01:19
Advertencia	Molino ML-201	Temperatura en advertencia	Tendencia demo de chumacera cercana al límite conceptual.	02/08/2026 00:54
Sin comunicación	Bomba P-602B	Sin comunicación	No hay lectura demo disponible para el equipo de respaldo.	02/08/2026 01:30

Notas del MVP

Este reporte se genera localmente desde la misma fuente de datos demo utilizada por el dashboard. No incluye recuperación metalúrgica, ley de mineral, conexión SCADA/PLC ni escritura hacia sistemas de control.
